

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 29/06/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 01/07/2021
Verslagnummer: 0704-210629-02_01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 016 63 47 45 E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0704

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VANDERWAEREN WIM
 Adres: KESSEL-LOSESTEENWEG 12, 3012 WILSELE
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: MAES CHRISTINA
 Adres: BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 98, 3000 LEUVEN
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: VANDERWAEREN WIM
 Adres: KESSEL-LOSESTEENWEG 12,3012 WILSELE
 BTW-nummer: 0895346325

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: MAES CHRISTINA
 Adres: BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 98, 3000 LEUVEN
 EAN- code:
 Nummer teller: 12687314
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_01-08_01 09/20



1 / 3

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 3

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 1+2+9 (reserve inbegrepen)


BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

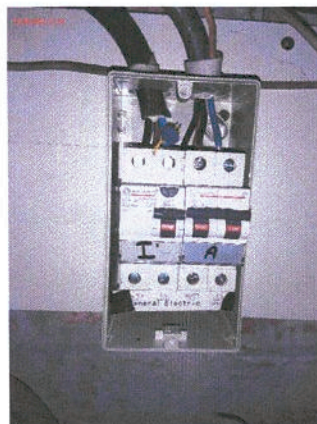

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 25,4 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 40 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

1 Dit verslag annuleert en vervangt het verslag nr 0704-210629-02

Besluit van de controle:

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 29/06/2046
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

